



Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones



Manual: Aplicativo informático del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)

Marzo 2025



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



El manual tiene como objetivo brindar a los usuarios de los aplicativos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), las pautas para el conocimiento y uso del “Manual Sistema de Seguimiento de Inversiones” (SSI).

Para más información ingresar a la sección de Instructivos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del siguiente QR:



Coordinación general:

Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública

Fecha:

Marzo 2025

Contenido

I. Acerca del manual 5

Esta sección presenta el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), señala su relación con otros sistemas informáticos del Estado, así como sus cuatro objetivos relacionados con la sistematización de información y la adecuada gestión de la inversión pública.

-
- 1.1. ¿Qué es el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)?..... 5
 - 1.2. Objetivos del SSI 5

II. Requerimientos del sistema 6

Esta sección plantea los requisitos mínimos de software y hardware que necesitan los operadores para acceder y desenvolverse en el manual del SSI.

III. Aplicativo del SSI 7

Esta sección explica el procedimiento que debe seguir el usuario para acceder al aplicativo SSI, así como las secciones y herramientas (botones, aplicaciones, archivos, formatos) con las que cuenta para acceder y; luego, gestionar información importante sobre las inversiones públicas.

-
- 3.1. Procedimiento para ingresar al SSI 7
 - 3.2. Entorno del SSI..... 8
 - 3.2.1. Acceso a operadores 9
 - 3.2.2. Opciones de búsqueda 10
 - a) Búsqueda Cód. SNIP o CUI 10
 - b) Búsqueda por nombre 11
 - c) Búsqueda por GeoInvierte..... 12
 - 3.2.3. Sección de información..... 13
 - a) Datos generales..... 13
 - b) Ejecución financiera 25
 - c) Contrataciones..... 28
 - d) InfObras 29
 - e) Vista Resumen 29
 - 3.2.4. Búsqueda Agregada 30

Gráficos

Gráfico 1:	Pantalla de acceso al aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones.....	7
Gráfico 2:	Módulo de Seguimiento de Inversiones.....	8
Gráfico 3:	Acceso a operadores	9
Gráfico 4:	Pantalla principal del aplicativo del Banco de Inversiones.....	9
Gráfico 5:	Pantalla principal del Sistema del Banco de Inversiones.....	10
Gráfico 6:	Pantalla de búsqueda por CUI o Código SNIP.....	10
Gráfico 7:	Pantalla de búsqueda por nombre.....	11
Gráfico 8:	Ventana de búsqueda por nombre	11
Gráfico 9:	Pantalla de la opción buscar por GeoInvierte en el SSI.....	12
Gráfico 10:	Pantalla de búsqueda con el aplicativo GeoInvierte.....	12
Gráfico 11:	Pantalla de la sección nivel de Gobierno Nacional	13
Gráfico 12:	Pantalla de la sección Datos Generales	14
Gráfico 13:	Pantalla del formato de formulación y evaluación de la inversión.....	15
Gráfico 14:	Pantalla de la ubicación espacial de la inversión.....	15
Gráfico 15:	Lista de modificaciones registradas de la inversión	16
Gráfico 16:	Pantalla del reporte de Seguimiento a la Ejecución de la Inversión	18
Gráfico 17:	Pantalla de Registro de Formato N.º 09 de la Inversión	18
Gráfico 18:	Pantalla de la sección Datos de la Inversión	19
Gráfico 19:	Pantalla de la sección de Información de Ejecución Financiera	25
Gráfico 20:	Pantalla de la sección de Información de Devengado Mensualizado de la Inversión.....	26
Gráfico 21:	Pantalla de la Información Histórico de Devengado por Específica de Gasto.....	26

Gráfico 22:	Pantalla por Unidad Ejecutora Presupuestal	26
Gráfico 23:	Pantalla de la sección de Información Financiera por Fuente de Financiamiento	27
Gráfico 24:	Pantalla de la sección de Información Financiera por Año de Ejecución	27
Gráfico 25:	Pantalla de la sección Contrataciones.....	28
Gráfico 26:	Pantalla de la sección InfObras	29
Gráfico 27:	Pantalla de la sección Vista Resumen	30
Gráfico 28:	Pantalla de la ventana de Búsqueda Agregada	30
Gráfico 29:	Descarga de información de la sección Búsqueda Agregada	31


I. Acerca del manual

1.1. ¿Qué es el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)?

Es una herramienta informática de acceso público que permite el seguimiento de las inversiones públicas e integra información de las diferentes fases del Ciclo de Inversión como: Programación Multianual de Inversiones, Formulación y Evaluación, y Ejecución. Además, el SSI está vinculado con varios sistemas informáticos del Estado como: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), Sistema de Información de Obras Públicas (InfObras) y el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).


1.2. Objetivos del SSI

El Sistema de Seguimiento de Inversiones tiene cuatro objetivos y son los siguientes:

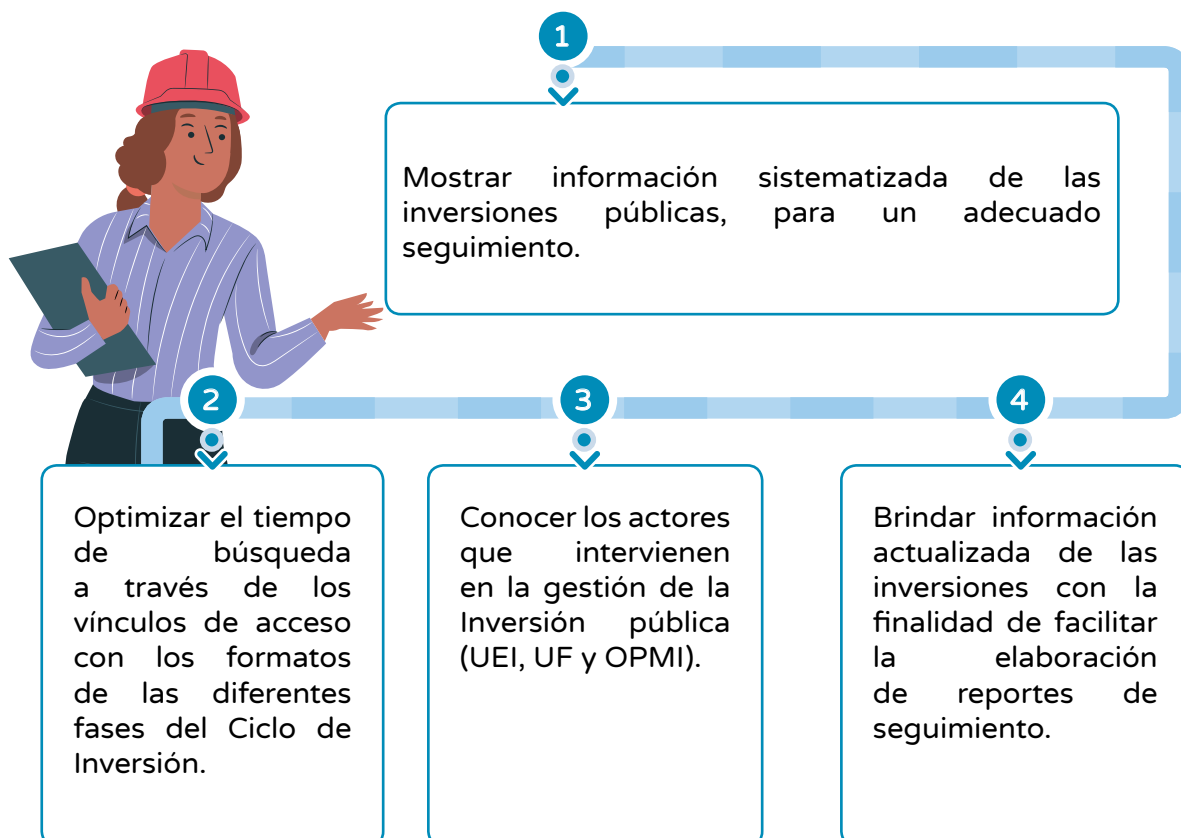

II. Requerimientos del Sistema

Para usar el módulo de SSI es necesario contar con una lista de requisitos mínimos que debe cumplir el sistema informático. Además, el usuario debe comprobar que el hardware y el software cumplen o superan los requisitos mínimos establecidos. Si el hardware y el software no cumplen con los requisitos mínimos, es posible que se presenten tiempos de carga más lentos.

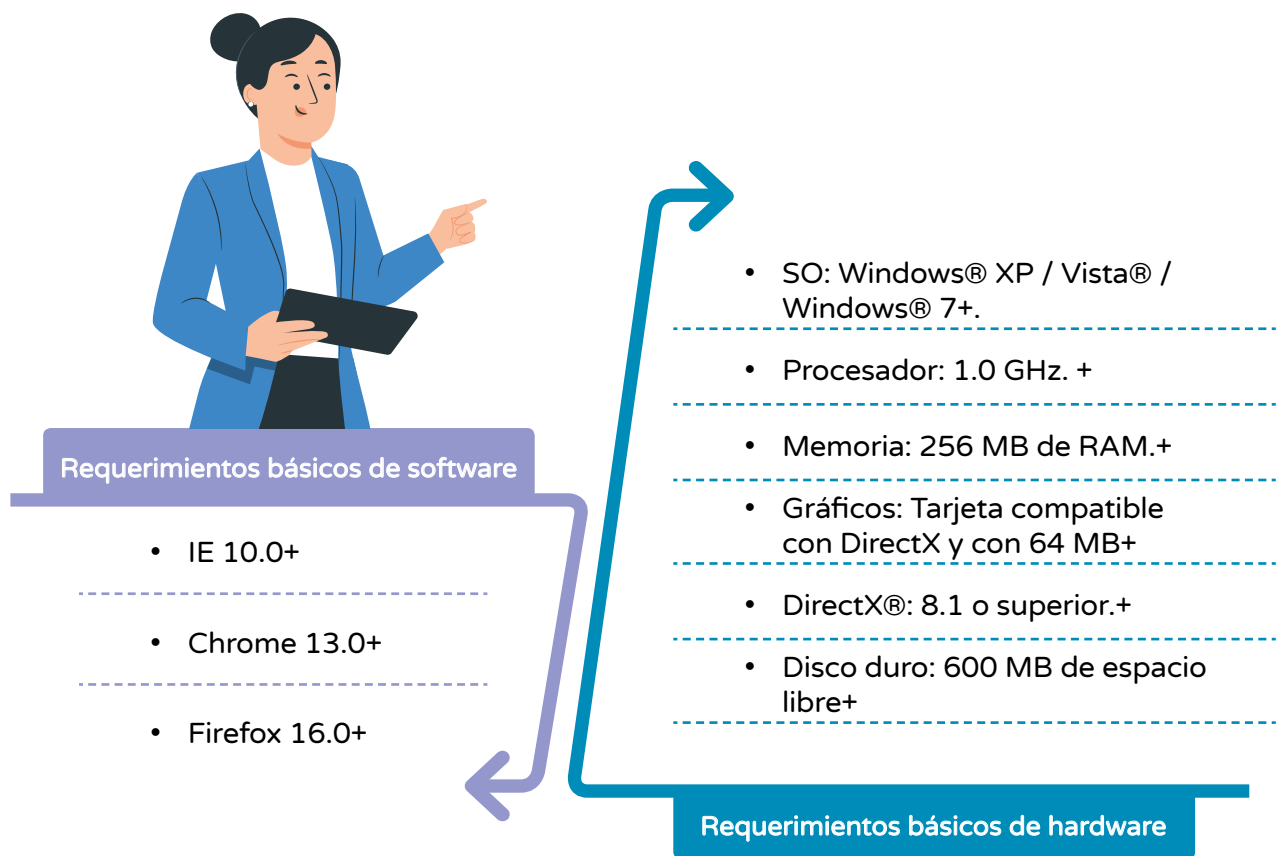

Se recomienda establecer una buena conexión con el equipo para que puedan trabajar de manera ágil.

III. Aplicativo del SSI

3.1. Procedimiento para ingresar al SSI

> Paso 1

El usuario del SNPMGI ingresa al siguiente enlace del MEF:


https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100280&lang=es-ES&view=article&id=2771

Una vez que ingresa, visualiza en la pantalla “Aplicaciones Informáticas”; luego, hace clic en “SSI”, tal como se visualiza en el Gráfico 1.



Gráfico 1

Pantalla de acceso al aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

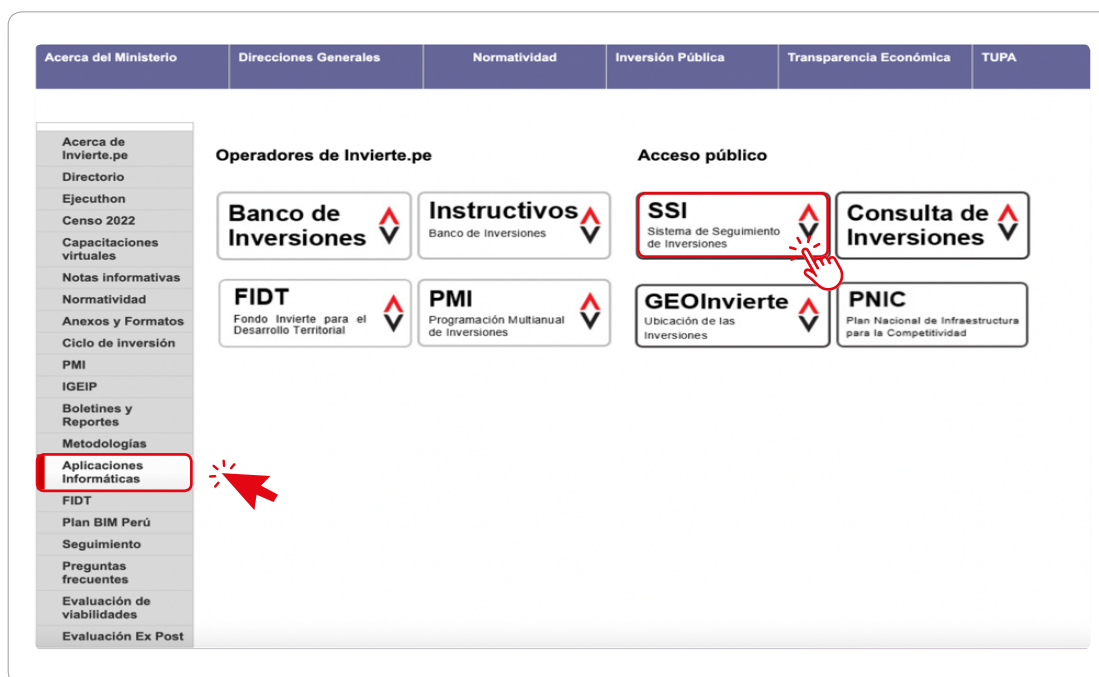

También, puede ingresar al SSI, a través del siguiente enlace:
<https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index>

3.2. Entorno del SSI

A continuación, se presenta el entorno y herramientas que conforman el SSI (ver Gráfico 2):

Gráfico 2

Módulo de Seguimiento de Inversiones



- 1 Acceso a operadores 2 Opciones de búsqueda 3 Sección de información
4 Vista resumen 5 Búsqueda agregada

Es importante tener en cuenta que, en el SSI debe revisar la sección de “Consideraciones”, ubicada al pie de la pantalla principal (ver Gráfico 2).

Donde se precisa:

- La fuente oficial de cada sección (Datos Generales, Contrataciones, Ejecución Financiera e InfObras).
- La fecha de la información mostrada (Recuerda que cualquier modificación realizada en los formatos de la Directiva durante el día se visualizará en el SSI al día siguiente).

Además, presenta las fuentes oficiales de cada sección:

- Datos Generales: Banco de Inversiones del SNPMGI.
- Contrataciones: SEACE – Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- Ejecución Financiera: Portal de Transparencia Económica – Consulta Amigable (MEF).
- InfObras: Sistema de Información de Obras Públicas – Contraloría General de la República (CGR).

3.2.1. Acceso a operadores

Este acceso es únicamente para inversiones del sector Defensa, de acuerdo con el artículo N.º 15 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para ello, hace clic en el botón [Acceso a Operadores](#) e ingresa el usuario y contraseña asignados (ver Gráfico 3).

Gráfico 3


Acceso a operadores



Una vez que ingresa, se visualiza la siguiente pantalla, tal como se observa en el Gráfico 4:

Gráfico 4


Pantalla principal del aplicativo del Banco de Inversiones

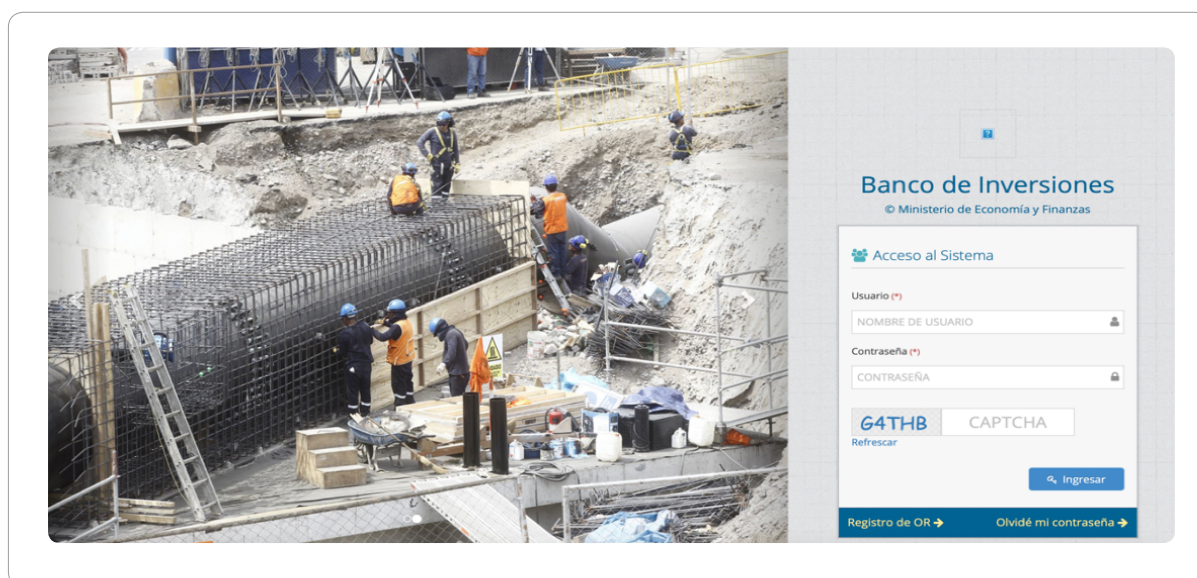

Luego, realiza lo siguiente: a) registra los datos asignados (usuario y contraseña), b) registra el código CAPTCHA que genere el aplicativo y c) pulsa el botón [Ingresar](#) (ver Gráfico 5):

Gráfico 5

Pantalla principal del Sistema del Banco de Inversiones

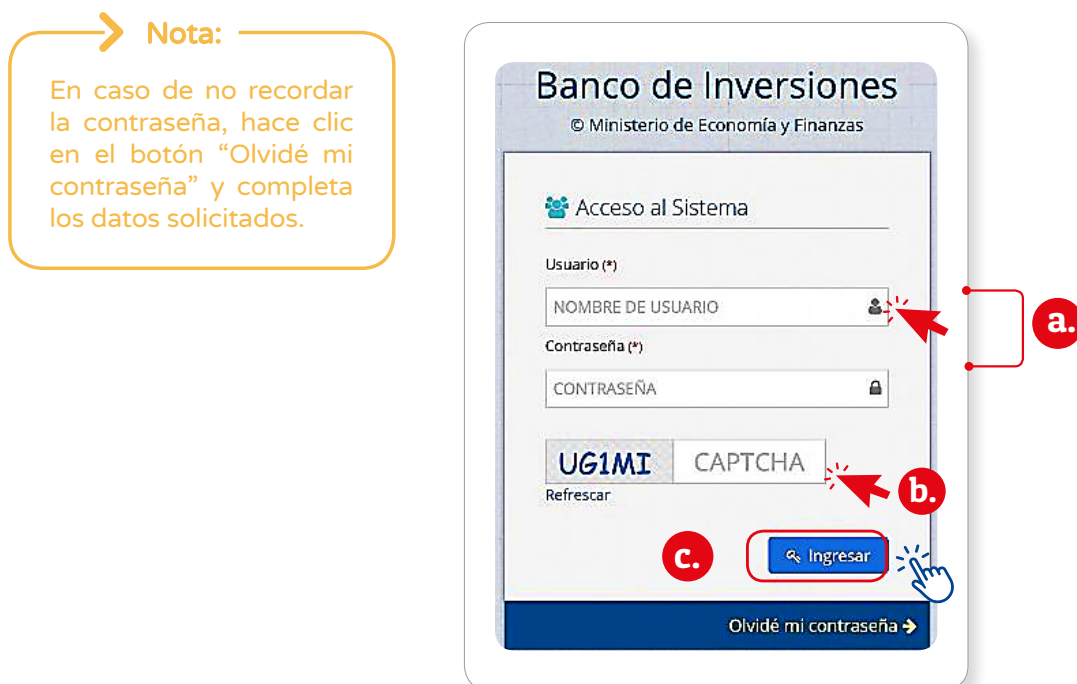

3.2.2. Opciones de búsqueda

a) Búsqueda Cód. SNIP o CUI


Después de ingresar al aplicativo del SSI, el usuario realiza lo siguiente: selecciona la opción “Cód. SNIP o CUI” y digita el código correspondiente; luego, hace clic en el ícono  (ver Gráfico 6).

Gráfico 6

Pantalla de búsqueda por CUI o Código SNIP



b) Búsqueda por nombre

Después, de ingresar al aplicativo del SSI, el usuario realiza lo siguiente: selecciona la opción “Búsqueda por nombre”; luego, hace clic en el campo habilitado para ingresar la información (ver Gráfico 7).

Gráfico 7

Pantalla de búsqueda por nombre





Seguidamente, aparece una ventana de “Búsqueda por nombre”; para ello, el usuario realiza lo siguiente: a) Digita la descripción de la inversión; b) hace clic en el botón ; c) luego, se genera un listado de inversiones que cumplen con la descripción ingresada; d) por último, el usuario selecciona la inversión que desea analizar y hace clic sobre el código o nombre de la inversión (ver Gráfico 8).

Gráfico 8

Ventana de búsqueda por nombre

Búsqueda por nombre


Busca

Código único	Código SNIP	Nombre de la inversión	Estado	Situación
2086403	90858	MEJORAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN CIRUGIA POR CATARATA EXTRACAPSULAR A POBLADORES MAYORES DE 50 AÑOS EN MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CEGUERA EN EL HOSPITAL DE MOQUEGUA	CERRADO	VIABLE
2057931	71957	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	ACTIVO	VIABLE



Para la “búsqueda por nombre”, tenga en cuenta que, la combinación de palabras deberá coincidir, de manera consecutiva, con una parte del nombre de la inversión que busca.

c) Búsqueda por GeoInvierte

El usuario una vez que ingresó al aplicativo del SSI, selecciona la opción GeoInvierte y hace clic en el campo habilitado (ver Gráfico 9).

Gráfico 9

Pantalla de la opción buscar por GeoInvierte en el SSI




Entonces, la página se redirigirá al aplicativo GeoInvierte; para ello, el usuario hace clic en el botón “Ubicación geográfica” para realizar la búsqueda por inversión pública. En esta sección, podrá ubicar geográficamente la inversión; para ello, selecciona y despliega las opciones por departamento, provincia y distrito y en el icono  (ver Gráfico 10).

Gráfico 10


Pantalla de búsqueda con el aplicativo GeoInvierte



El usuario, debe ubicarse espacialmente en la inversión; luego, hace clic en el ícono que la representa. Entonces, se muestra una ventana emergente con la información de la inversión e inmediatamente, hace clic en el campo LINK SSI. Después, es redirigido automáticamente al SSI (ver Gráfico 11).

Gráfico 11

Pantalla de la sección nivel de Gobierno Nacional

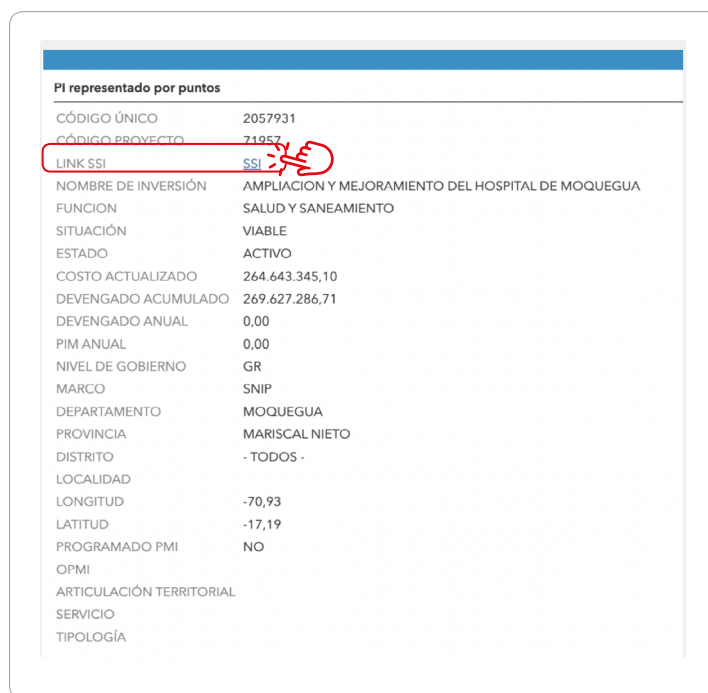

PI representado por puntos	
CÓDIGO ÚNICO	2057931
CÓDIGO PROYECTO	71957
LINK SSI	SSI
NOMBRE DE INVERSIÓN	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA
FUNCION	SALUD Y SANEAMIENTO
SITUACIÓN	VIABLE
ESTADO	ACTIVO
COSTO ACTUALIZADO	264.643.345,10
DEVENGADO ACUMULADO	269.627.286,71
DEVENGADO ANUAL	0,00
PIM ANUAL	0,00
NIVEL DE GOBIERNO	GR
MARCO	SNIP
DEPARTAMENTO	MOQUEGUA
PROVINCIA	MARISCAL NIETO
DISTRITO	- TODOS -
LOCALIDAD	
LONGITUD	-70,93
LATITUD	-17,19
PROGRAMADO PMI	NO
OPMI	
ARTICULACIÓN TERRITORIAL	
SERVICIO	
TIPOLOGÍA	

3.2.3. Sección de información

a) Datos generales

Una vez ubicada la inversión, se visualiza automáticamente la sección “Datos Generales”, que se divide en cuatro secciones: Institucionalidad, Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Datos de la fase de Ejecución y Contribución al Cierre de Brechas (ver Gráfico 12).

En la sección de “Institucionalidad” se presenta la información de:

Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), la Unidad Formuladora (UF) y la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), de acuerdo con la fase del Ciclo de Inversión en la que se encuentra la inversión.

Si la inversión se encuentra en la fase de Formulación y Evaluación, se muestra las unidades orgánicas responsables de esta etapa. A medida que la inversión avanza a otras fases del ciclo, la información reflejada en esta sección se actualizará para incluir las entidades responsables de su ejecución.

Gráfico 12

Pantalla de la sección Datos Generales

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

invierte.pe

Acceso a Operadores

Opciones de búsqueda

2057931

Búsqueda por nombre

invierte

Vista Resumen

CÓDIGO ÚNICO	2057931	CÓDIGO SNIP	71957	FECHA DE REGISTRO	21/12/2007
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	NO

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	VIABLE		COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a)	42,303,634.00
FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	28/12/2007		COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (S/)(b)	0.00
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO		COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a+b)	42,303,634.00
CADENA FUNCIONAL	SALUD Y SANEAMIENTO - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA		BENEFICIARIOS (HABITANTES)	98,888
			UBICACIÓN	

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI		COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)(a)	264,643,345.1
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI		COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (S/)(b)	0.00
REGISTRO DE CIERRE	SÍ, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		COSTO DE CONTROVERSIAS (S/)(c)	10,439,975.23
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	03/06/2008		MONTO DE CARTA FIANZA (S/)(d)	0.00
FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	29/02/2024		COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)(a+b+c+d)	275,083,320.33

IV. CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE HOSPITALES CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESTADO
UNIDAD DE MEDIDA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	VALOR DE LA CONTRIBUCIÓN
		0



Es importante recordar que:

Los botones resaltados en el Gráfico 12 se muestran solo si los operadores de la UEI y UF registraron información en el Banco de Inversiones (BI).

La información de la sección “Datos de la Fase de Formulación y Evaluación” está vinculada con los Formatos N.º 07 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe o al Formato SNIP N.º 03 del Sistema Nacional de Inversión Pública (derogado mediante Decreto Legislativo N.º 1252).

El usuario podrá acceder a la información; para ello, hace clic en el ícono (ver Gráfico 12). Luego, se muestra la información “Formulación y Evaluación de la Inversión” (ver Gráfico 13).

Gráfico 13*Pantalla del formato de formulación y evaluación de la inversión*

FORMATO N° 07-C

Fecha de registro: 30/06/2022 19:00:06 - Fecha de aprobación: 1/07/2022 15:55:31
 Estado: **APROBADO** Situación: **APROBADO**
 Registros en la fase de ejecución

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL C.P EL INGENIO DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA

Código único de inversiones	2555793
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función	18 SANEAMIENTO
División funcional	040 SANEAMIENTO
Grupo funcional	0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable	VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto	SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO

Exportar PDF




Además, dentro de la información de la sección “Datos de la Fase de Formulación y Evaluación” (ver Gráfico 12), el usuario tiene la opción de visualizar la información de la inversión de manera espacial. Para ello, hace clic en el ícono  (ver Gráfico 14).

Gráfico 14*Pantalla de la ubicación espacial de la inversión*

En la sección “**Datos de la fase de Ejecución**” (ver Gráfico 12), el usuario, tiene la opción de acceder a la información del Formato N.º 08 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Para ello, el usuario hace clic en el ícono ; luego, hace clic en el ícono  (ver Gráfico 15).


Al dar clic en el ícono  te remitirá a un formulario “Lista de modificaciones en Fase de Ejecución” (ver Gráfico 15).

Gráfico 15

Lista de modificaciones registradas de la inversión

Datos generales del proyecto o inversión

Código único de inversiones

Nombre de la inversión

Monto de la inversión

Monto actualizado

2057931

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA

S/42,303,634.00

S/264,643,345.10

Lista de modificaciones en Fase de Ejecución

Fecha de última modificación	Monto actualizado S/	Comentarios	Usuario	Tipo de documento	¿Es histórico?	Ver
13/04/2023 18:00:26	S/264,643,345.10	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION - INVIERTE	UF: UFGRI / UEI: UEIGRMQ013		NO	<div><div><div></div></div><div></div></div>
13/09/2017 15:52:41	S/251,951,246.67		PRESECTARMQ	RESE	NO	<div><div><div></div></div><div></div></div>
4/09/2017 09:06:36	S/251,611,712.20		PRESECTARMQ	RESE	NO	<div><div><div></div></div><div></div></div>
16/08/2017 11:51:40	S/251,239,176.78		PRESECTARMQ	RESE	NO	<div><div><div></div></div><div></div></div>



La fecha de inicio de ejecución proviene del Formato N.º 8-A y forma parte de la fase de ejecución del proyecto. Este formato recoge información clave de la ejecución de la inversión e incluye la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y su viabilidad.

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?

SI

¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?

SI

REGISTRO DE CIERRE

NO

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN

21/03/2016

FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN

06/10/2026

COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)(a)

253,671,545.69

COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (S/)(b)

1,268,357.73

COSTO DE CONTROVERSIAS (S/)(c)

0.00

MONTO DE CARTA FIANZA (S/)(d)

0.00

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)(a+b+c+d)

254,939,903.42

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Exportar PDF

Fecha de registro 6/11/2018 12:28:46 Fecha de modificación: 4/03/2025 19:41:46

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Historial de cambio de unidades responsables

C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física

Modificaciones durante la ejecución física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
Infraestructura Vial										
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	56.43 KM	168,896,537.31	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	14/02/2024	1/06/2026	5/02/2027	UEIGRPA003	INFORME N° 1226-2025-GRP-GGR-GRJ-SGSO. (3/03/2025)
IMPLEMENTACION DE SEÑALES DE TRÁFICO :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	53081 KM	8,210,059.58	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	14/02/2024	1/06/2026	5/02/2027	UEIGRPA003	INFORME N°1114-2025-GRP-GGR-GRJ-SGSO. (28/02/2025)
Gastos Generales por Covid - 19 :	INTANGIBLES			0.00					UEIGRPA003	N°0478-2022-G.R.P./GGR (2/08/2022)
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRPA003	
Subtotal: S/:				237,240,294.76						
GESTION DEL PROYECTO: S/:					2,751,500.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2024	1/06/2026	UEIPASCO1	INFORME N°1114-2025-GRP-GGR-GRJ-SGSO. (28/02/2025)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/:					2,542,300.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	21/03/2016	24/06/2016	UEIPASCO1	N°0411-2020-G.R.P./GGR (6/11/2020)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/:					0.00				UEIGRPA003	
SUPERVISIÓN: S/:					11,137,450.93	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	14/02/2024	3/08/2026	UEIPASCO1	INFORME N°1114-2025-GRP-GGR-GRJ-SGSO. (28/02/2025)
SUPERVISIÓN COVID: S/:					0.00				UEIGRPA003	
LIQUIDACIÓN: S/:					0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	7/08/2026	6/10/2026	UEIPASCO1	INFORME N°1114-2025-GRP-GGR-GRJ-SGSO. (28/02/2025)



¿Qué sucedería si al descargar el Formato N.º 08-A no se visualizan algunos datos?

El caso de María, usuaria del SSI, ayuda a responder la pregunta.




Revisando el Formato N.º 08-A, me di cuenta de que faltaban datos como la fecha de fin de ejecución y de inicio de operación.

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	
Horizonte de evaluación (años)	0
Costos (soles)	

Entonces, María recordó que la fecha fin de ejecución se actualiza durante la fase de Ejecución, utilizando el Formato N.º 08-A. De modo que, si esta información no había sido actualizada y registrada, no se podría visualizar. Por esta razón, se comunicó con la UEI para que actualizara y registrara la información faltante.

En la misma sección “Datos de la fase de Ejecución” (ver Gráfico 12), el usuario tiene la opción de acceder directamente al reporte de seguimiento a la ejecución de la inversión, que ha sido registrado mediante el “Formato N.º 12-B: Seguimiento para la ejecución de las inversiones”, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Para ello, hace clic en el ícono . Después de que pulsa el ícono, se muestra el “Reporte de Seguimiento” (ver Gráfico 16).



Se aplica en la fase de formulación y evaluación de los proyectos de inversión, según lo establecido en la Ley N.º 31358 y modificatorias, Ley expansión del Control Concurrente.



El costo de control concurrente (CCC)



Se refiere a los análisis y consideraciones económicas que se evalúan al decidir si proseguir con una disputa mediante arbitraje o conciliación en el contexto de las contrataciones del Estado, el reglamento de la Ley General de Contrataciones.



El costo de controversia

Gráfico 16
Pantalla del reporte de Seguimiento a la Ejecución de la Inversión



PERÚ
Ministerio de Economía y Finanzas



invierte.pe

Fecha Últ. Modificación: 29/11/2024



**REPORTE DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL
FORMATO N° 12-B**

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:











1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2057931	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA. ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	REGISTRO DE CIERRE:	Sí, en proceso de liquidación 
UEI:	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PMI AÑO 1 <2026>	0
		PMI AÑO 2 <2027>	0
		PMI AÑO 3 <2028>	0

2. FOTOGRAFÍAS




De manera complementaria, el usuario, podrá visualizar información del “Formato N.º 09: Cierre de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”. Para ello, hace clic en el ícono  (ver Gráfico 16), que se muestra si la inversión cuenta con algún registro de cierre (ver Gráfico 17).

Gráfico 17
Pantalla de Registro de Formato N.º 09 de la Inversión

FORMATO N° 09: Registro de cierre de inversión

Fecha de habilitación: 10/03/2023 20:57:12 Fecha de registro: 10/03/2023 20:57:12

 Exportar PDF

A. DATOS GENERALES DE LA INVERSIÓN

Nombre de la inversión	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA
Código único de inversiones	2057931
Fecha de viabilidad/aprobación	28/12/2007
Costo total de inversión aprobado	264,388,207.60
Costo total de inversión actualizado	42,303,634.00
Costo total de inversión ejecutado (Devengado acumulado)	269,627,286.71
Fecha primer Devengado	01/2009
Fecha último Devengado	12/2023
Avance Financiero Acumulado	98.02
Avance Físico	92.83


Finalmente, y de manera transversal, el usuario podrá verificar la información relacionada con el Código Único y Código SNIP, fecha de registro, nombre de la inversión, estado de la inversión, tipo de la inversión y si la inversión se encuentra programada en el PMI. Para ello, hace clic en el ícono **SI**  que lo llevará directamente a la página de Consulta de Cartera PMI (ver Gráfico 18).

Gráfico 18

Pantalla de la sección Datos de la Inversión

CÓDIGO ÚNICO	2194576	CÓDIGO SNIP	256102	FECHA DE REGISTRO	09/04/2013
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 




Es importante recordar que:

Los usuarios tengan presente que cualquier modificación realizada durante el día en los formatos de la Directiva, se visualizará en el módulo del SSI al día siguiente.

La sección “Contribución al Cierre de Brechas” del SSI (ver Gráfico 12), presenta información de cómo una inversión contribuye al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios a favor de la población. Esta información se basa en lo reportado en el Formato N.º 09 Registro de cierre de inversión de la sección B3: Confirmación de la Contribución al Cierre de Brechas en el Banco de Inversiones.

Esta sección contiene los siguientes elementos:

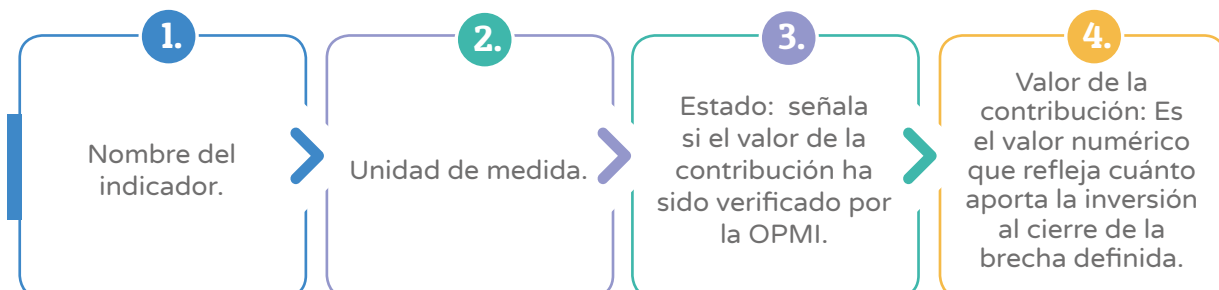



➤ Nota:

Recuerda que la **información se activa automáticamente** en el SSI una vez que la UEI ha registrado el Formato N.º 09.
El estado “**Verificado**” indica que la **OPMI ha revisado y validado** el contenido del Formato N.º 09 correspondiente a esa inversión.

En esta sección se visualizan datos de la obra como:

- Fecha de registro y fecha de paralización
- Código InfoBRAS
- Descripción de la obra
- Modalidad de ejecución
- Avance físico al momento de la paralización
- Motivo de la paralización
- Situación de la obra
- Enlaces a informes situacionales y resoluciones vinculadas

Esta información es solo informativa, ya que permite hacer el seguimiento a los proyectos detenidos con miras a su reactivación o cierre técnico.

Por ejemplo, si ingresa al SSI y escribe el CUI  ; luego, hace clic en . Entonces, visualiza:

VI. REGISTRO DE OBRAS PARALIZADAS (LEY N° 31589 Y SUS MODIFICATORIAS)			
FECHA DE REGISTRO	31/05/2024	CÓDIGO INFOBRAS	17750
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACocha, II ETAPA - SECTOR 10, PUCALLPA		
MODALIDAD	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA		
AVANCE FÍSICO	64 %	FECHA DE PARALIZACIÓN	19/12/2016
MOTIVOS DE PARALIZACIÓN	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 19/12/2016. CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 63.83%.		
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL	Informe N° 242-2024-iss	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA LISTA PRIORIZADA	RERV 201_2024_GRU_GR
SITUACIÓN DE LA OBRA PARALIZADA	19/11/2024 En actos previos para elaborar el expediente técnico de saldo de obra		

En la **Sección de Alertas en el SSI**, se considera:

- Alertas del Registro de cierre de brechas en el Formato 9 Registro de Cierre de Inversión.



Objetivo


Informar a los usuarios del SSI sobre las alertas automáticas para el registro oportuno de la Sección C del Formato N.º 09 Registro de Cierre de Inversión.

Activación de la Alerta


El sistema muestra la alerta a partir de la “Fecha real de culminación” registrada en la B2: Datos de la Culminación del Formato N° 09.


A partir de dicha fecha, el sistema considera un plazo máximo de 180 días calendario para el registro de la Sección C. Según el conteo automático del aplicativo, se mostrarán mensajes en el SSI.

Manual: Aplicativo informático del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)


Por ejemplo, si ingresa al SSI y escribe el CUI ; luego, hace clic en . Entonces, visualiza:




Después se ubica en “Datos de la fase de ejecución” y hace clic en el ícono  ; luego, visualiza:

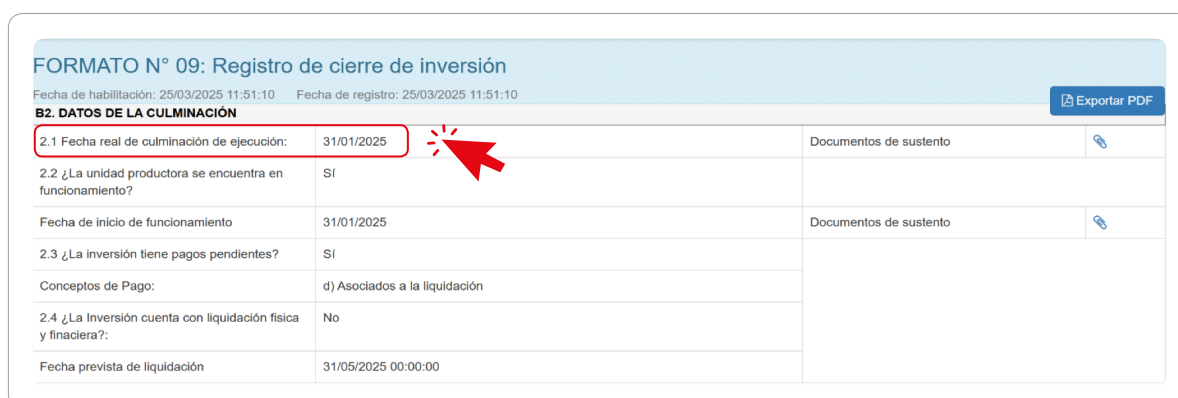

FORMATO N° 09: Registro de cierre de inversión	
Fecha de habilitación: 25/03/2025 11:51:10 Fecha de registro: 25/03/2025 11:51:10	
B2. DATOS DE LA CULMINACIÓN	
2.1 Fecha real de culminación de ejecución:	31/01/2025
2.2 ¿La unidad productora se encuentra en funcionamiento?	Sí
Fecha de inicio de funcionamiento	31/01/2025
2.3 ¿La inversión tiene pagos pendientes?	Sí
Conceptos de Pago:	d) Asociados a la liquidación
2.4 ¿La Inversión cuenta con liquidación física y financiera?:	No
Fecha prevista de liquidación	31/05/2025 00:00:00

Por ejemplo, si ingresa al SSI y escribe el CUI ; luego, hace clic en . Entonces, visualiza:





Después se ubica en “Datos de la fase de ejecución” y hace clic en el ícono  ; luego, visualiza:

FORMATO N° 09: Registro de cierre de inversión


Fecha de habilitación: 24/02/2025 16:25:27 Fecha de registro: 24/02/2025 16:25:27 [Exportar PDF](#)

B2. DATOS DE LA CULMINACIÓN

2.1 Fecha real de culminación de ejecución:	25/01/2024	Documentos de sustento	
2.2 ¿La unidad productora se encuentra en funcionamiento?	Si		
Fecha de inicio de funcionamiento	25/01/2024	Documentos de sustento	
2.3 ¿La inversión tiene pagos pendientes?	No		
2.4 ¿La Inversión cuenta con liquidación física y financiera?:	Si		
Fecha de liquidación	22/05/2024 00:00:00		

B3. CONFIRMACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS

Sector Responsable	Servicio	Tipología	Indicador de Brecha Unidad de medida	Unidad de medida	Contribución de cierre de brechas
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA		PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE VÍAS URBANAS	PERSONAS	317



- **Alertas por pérdida de vigencia de viabilidad y desactivación de inversiones**

Con la finalidad de garantizar la calidad y oportunidad de la información registrada en el BI, en el SSI se mostrarán alertas automáticas cuando un proyecto de inversión declarado viable pierda su vigencia sin que se hayan realizado las actualizaciones correspondientes.

Estas alertas tienen como objetivo advertir a las entidades responsables sobre la situación de las inversiones, brindando un plazo prudencial para tomar acciones antes de su desactivación definitiva.

Generación de la alerta

El sistema emitirá una alerta cuando se verifique alguno de los siguientes supuestos:

- El proyecto de inversión declarado viable ha perdido vigencia y, pasado un (01) año, no se ha actualizado la ficha técnica o el estudio de preinversión que fundamenta su viabilidad mediante el Formato N° 07-A.
- El proyecto de inversión actualizado en el BI ha superado los tres (03) años sin contar con la aprobación de la consistencia del ET/DE.

Nota:

Para mayor detalle sobre los criterios, supuestos y procedimientos de desactivación de inversiones en el BI, se recomienda consultar el documento oficial del MEF: "Criterios para la desactivación de inversiones en el Banco de Inversiones", aprobado mediante Resolución Directoral N.º 0004-2021-EF/63.01.

Disponible en el siguiente enlace: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo_RD004_2021EF6301.pdf

Por ejemplo, si ingresa al siguiente enlace:

<https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/informeCierre/consultaCierre/2194436> y

escribe el CUI ; luego, hace clic en . Entonces, visualiza:

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

SSI SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

invierte.pe

Acceso a Operadores

Opciones de búsqueda

La declaratoria de viabilidad perdió vigencia. Cuenta con 84 días para registrar la actualización del documento técnico que sustentó la viabilidad en el Formato N° 07-A, caso contrario, será desactivado automáticamente

CÓDIGO ÚNICO	2522083	CÓDIGO SNIP	2522083	FECHA DE REGISTRO	18/06/2021
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL JR. PROLONGACION BALTA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARCOS, DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	NO

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCAS
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCAS
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCAS

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	VIABLE	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a)	258.200.34
FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	23/06/2021	COSTO DE CONTROL CONCURRENTES (S/)(b)	0.00
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a+b)	258.200.34
CADENA FUNCIONAL	TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	2.207
		UBICACIÓN	

b) Ejecución financiera


Una vez ubicada la inversión, para acceder a la sección de “ejecución financiera”; el usuario hace clic en el botón . Luego, se muestra cuatro secciones: información financiera, histórico de devengado de la inversión, histórico de devengado por específica y detalle por Unidad Ejecutora Presupuestal. En esta sección, se visualizan la ejecución financiera de toda la inversión, así como el presupuesto asignado en el año fiscal y su respectiva ejecución financiera (ver Gráfico 19).

Gráfico 19
Pantalla de la sección de Información de Ejecución Financiera



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

invierte.pe

Acceso a Operadores

Opciones de búsqueda

2057931

Búsqueda por nombre

invierte

Vista Resumen









CÓDIGO ÚNICO	2057931	CÓDIGO SNIP	71957	FECHA DE REGISTRO	21/12/2007
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	NO

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO (a)	275,083,320.33	PIM 2025 (c)	0.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2025 (b)	269,627,286.71	DEVENGADO 2025 (d)	0.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	98 %	AVANCE FINANCIERO 2025 (d/c)	0 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	5,456,033.62	SALDO POR DEVENGAR 2025 (c-d)	0.00
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	MAY-2008	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	DIC-2023

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	ORIGEN	
2008	0.00	812,588.00	0.00	439,872.46	439,872.46	SIAF	


Es importante resaltar que en la sección “Histórico de Devengado de la Inversión” (ver Gráfico 19), el usuario visualiza la información de la columna de “Devengado Mensualizado”, desde el inicio de la ejecución. Para ello, hace clic en el ícono . El resultado se muestra en el Gráfico 20.

Gráfico 20

Pantalla de la sección de Información de Devengado Mensualizado de la Inversión

DEVENGADO MENSUALIZADO (S/)											
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov
2008	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4,290.00	9,410.00	380,050.2	7,830.7	623.5	22,864.1
2009	5,213.83	7,830.00	3,815.00	.00	12,598.00	15,260.00	210,718.93	11,445.00	7,957.00	11,772.00	.00
2010	12,639.94	27,879.7	10,140.00	3,500.00	10,800.00	.00	.00	-13,500.00	18,000.00	.00	.00
2012	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,089,562.03	.00	.00	.00	.00
2013	11,509.21	10,505.00	59,665.9	82,654.92	76,439.15	80,452.68	91,447.77	116,375.85	508,451.25	264,678.36	186,537.07
2014	.00	447,995.54	194,620.93	339,968.3	156,208.08	129,791.41	683,668.4	1,790,816.33	1,240,152.38	6,358,886.8	957,466.2
2015	.00	.00	.00	44,339.76	55,482.94	2,991,820.97	323,698.26	1,211,932.38	724,603.35	1,421,617.3	123,362.72
2016	21,583.00	2,085,885.36	1,628,489.19	2,228,524.86	1,935,597.91	6,904,754.4	13,412,136.27	6,925,334.98	4,942,156.74	9,741,159.03	-150,278.09
2017	5,814,929.25	7,070,830.2	15,815,708.24	7,799,573.17	12,750,090.79	7,041,824.54	1,802,994.85	3,931,435.59	486,223.64	4,456,192.33	95,911.29
2018	25,180.00	836,352.63	693,541.41	890,198.35	1,374,419.75	1,081,362.63	180,591.1	132,111.71	130,227.74	7,997,067.99	164,361.8
2019	11,917.33	33,949.66	174,815.68	171,776.5	178,771.55	739,760.26	147,097.02	2,110,114.77	206,731.6	391,044.97	2,225,819.82
2020	.00	25,958.99	106,002.83	56,780.7	23,357.56	123,904.54	96,876.91	51,021.05	50,936.61	69,542.3	92,300.87
2021	.00	28,150.1	71,379.77	53,183.29	147,983.56	52,589.59	52,646.94	47,195.59	103,956.4	49,889.33	78,981.11
2022	.00	.00	.00	9,599.00	18,504.99	23,701.5	30,863.33	25,145.00	55,391.2	51,925.00	43,688.75
2023	.00	1,799.00	16,095.00	62,116.00	40,153.36	28,831.00	32,785.00	11,485.00	11,485.00	47,714.3	23,310.00

Además, en la sección financiera se visualiza la información del Histórico de Devengado por Específica de Gasto, tal como se aprecia en el Gráfico 21.

Gráfico 21

Pantalla de la Información Histórico de Devengado por Específica de Gasto

III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/)						
ESPECÍFICA DE GASTO	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.6.22.3 INSTALACIONES MEDICAS	644,037.13	185,143.37	188,353.8	0.00	0.00	1,017,534.3
2.6.32.1 PARA OFICINA	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144,668.96	149,516.5	116,994.86	0.00	0.00	411,180.32






En la sección de “Unidad Ejecutora Presupuestal”, el usuario hace clic en el ícono  (ver Gráfico 22).

Gráfico 22

Pantalla por Unidad Ejecutora Presupuestal

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)		
UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE
REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL	269,627,286.71	 
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	0.00	 

Después de hacer clic visualiza la “Información financiera por fuente de financiamiento” (ver Gráfico 23).

Gráfico 23

Pantalla de la sección de Información Financiera por Fuente de Financiamiento

INFORMACIÓN FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/)			
FUENTE FINANCIERA	AÑO	PIM	DEV
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2008	812,588.00	439,872.46
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2009	1,741,327.00	15,440.67
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2009	2,744,932.00	286,609.76
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2010	3,066,849.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2010	13,328,599.00	69,459.64
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2011	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2012	342,767.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2012	1,142,595.00	1,089,562.03
RECURSOS ORDINARIOS	2013	35,067,743.00	27,151,002.01
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2013	157,246.00	125,486.76
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2013	255,600.00	134,267.43


Al hacer clic en el ícono  (ver Gráfico 22), se muestra la información financiera por año de ejecución de cada Unidad Ejecutora vinculada a la inversión (ver Gráfico 24).

Gráfico 24

Pantalla de la sección de Información Financiera por Año de Ejecución

INFORMACIÓN FINANCIERA POR AÑO DE EJECUCION (S/)											
AÑO	PIA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	DEVENGADO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
2008	0.00	812,588.00	0.00	439,872.46	439,872.46	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4,290.00
2009	5,000,000.00	4,486,259.00	0.00	302,050.43	302,050.43	5,213.83	7,830.00	3,815.00	.00	12,598.00	15,260.00
2010	3,550,000.00	16,395,448.00	0.00	69,459.64	69,459.64	12,639.94	27,879.7	10,140.00	3,500.00	10,800.00	.00
2011	10,000,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2012	17,039,484.00	1,485,362.00	1,089,562.03	1,089,562.03	1,089,562.03	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2013	41,541,343.00	35,628,925.00	27,566,723.31	27,566,723.31	27,559,091.31	11,509.21	10,505.00	59,665.9	82,654.92	76,439.15	80,452.6



El SSI es un sistema que muestra información del Portal de Transparencia Económica, módulo Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable). Si existe una variación en el devengado debe coordinar con OGTI (Oficina General de Tecnología de la Información) para que coordine con el encargado de la Consulta Amigable y realicen las actualizaciones".

c) Contrataciones



Una vez ubicada la inversión, el usuario para acceder a la sección de contrataciones, hace clic en el botón  (ver Gráfico 25). En esta sección visualiza los contratos agrupados por objeto contractual (bienes, servicios y obras). Solo se muestra los contratos suscritos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, dicha información se obtiene de la vinculación con la plataforma SEACE. El usuario para descargar los contratos hace clic en el ícono  de la columna "Ver contrato" (ver Gráfico 25).

Gráfico 25

Pantalla de la sección Contrataciones




SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES



2057931

Búsqueda por nombre



Vista Resumen







CÓDIGO ÚNICO	2057931	CÓDIGO SNIP	71957	FECHA DE REGISTRO	21/12/2007
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	NO

II. SERVICIO

N° DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CURSOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN BLS (SOPORTE VITAL BÁSICO), ACLS (ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT) Y ILLT (INTERNATIONAL LIFE SUPPORT) PARA EL COMPONENTE III DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL MOQUEGUA.	CENTRO ESPECIALIZADO EN FORMACION, ASESORIA, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL S.A.C.- CEFADep S.A.C	29-2018	27/11/2018	325,000.00	325,000.00	
1	SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA DEL EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	PINEARQ, S.L.P.	043-2016-ORA/GR.MOQ	21/11/2016	2,555,106.00	2,555,106.00	

28

d) InfObras


Una vez ubicada la inversión, el usuario para acceder a la sección de “InfObras” hace clic en el botón ; luego, se muestran las secciones de Datos generales y Avance físico de la obra (ver Gráfico 26).

Gráfico 26

Pantalla de la sección InfObras




En la sección InfObras se muestra la cantidad de obras o contratos asociados a la inversión y registrados en dicha sección.

e) Vista Resumen


El botón  **Vista Resumen**, permite al usuario visualizar un resumen de la información de las cuatro secciones del SSI. Además, puede imprimir o guardar el documento en formato PDF (ver Gráfico 27).

Gráfico 27

Pantalla de la sección Vista Resumen

FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO	2057931	CÓDIGO SNIP	71957	FECHA DE REGISTRO	21/12/2007
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	NO

DATOS GENERALES

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	VIABLE	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a)	42,303,634.00
FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	28/12/2007	CONTROL CONCURRENTES (S/)(b)	0.00
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a+b)	42,303,634.00
CADENA FUNCIONAL	SALUD Y SANEAMIENTO - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	98,888

Cerrar Imprimir

3.2.4. Búsqueda Agregada

El botón permite visualizar información agregada del tipo de inversión, el costo actualizado y número de inversiones. Para ello, en la ventana, el usuario selecciona el nivel de Gobierno (y el sector, de ser necesario); luego, hace clic en el ícono (ver Gráfico 28).

Gráfico 28

Pantalla de la ventana de Búsqueda Agregada

Búsqueda Agregada

NIVEL DE GOBIERNO:

☒ Gobierno Nacional ☐ Gobierno Regional ☐ Gobierno Local

Sector:

AGRICULTURA Y RIEGO

Tipo de inversión	Costo Actualizado	Numero de Inversiones
PROGRAMAS	139,281,107.4	4
FUR	786,034,229.36	261
PROYECTO DE INVERSIÓN	33,869,248,345.13	3717
IOARR	983,340,247.93	1274

Descargar


Finalmente, el usuario al hacer clic en el botón  **Descargar** , podrá descargar el desagregado de la información obtenida en formato Excel. En el Gráfico 29 visualiza un ejemplo de la información descargada.


Gráfico 29
Descarga de información de la sección Búsqueda Agregada


Reporte de SSI										
invierte.pe										
Fecha: 02/03/2025 02:14:54 a. m.										
P Registros: 5256										
CLB	CODIGO SNP	NOMBRE DE LA INVERSION	NIVEL DE GOBIERNO	SECTOR	ENTIDAD	ESTADO	SITUACION	BENEFICIARIOS	FECHA REGISTRO	FECHA VIABIL
2309667	327854	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA F/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	SERVICIO NACIONAL FORE	ACTIVO	VIABLE	42347	17/07/2015	30/10/201
2016076	2144	SISTEMA DE IRRIGACION PANGCA	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	VIABLE	4500	06/04/2002	09/12/201
2235093	250968	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEG	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	VIABLE	64	28/03/2014	11/12/201
2286002	328025	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO D/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	VIABLE	212	15/07/2015	17/08/201
2166858	10703	CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION A/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	ACTIVO	VIABLE	38906	05/07/2004	19/12/201
2400599	240550	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN ELLA/I/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	APROBADO	23/11/2017	11/06/201	
2405459	2405459	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN ELLA/I/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	APROBADO	22/01/2018	27/08/201	
2457388	2457388	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN ELLA/I/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	APROBADO	08/08/2019	21/08/201	
2157005	285139	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERS/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	VIABLE	10	24/02/2014	02/06/201
2042108	9314	CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CEN/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	INSTITUTO NACIONAL DE I	CERRADO	VIABLE	140213	29/03/2004	20/04/200
2312329	15546	IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUAMANGO	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	ACTIVO	VIABLE	4110	26/01/2005	26/10/201
2340395	323004	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO, EN LA I/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	ACTIVO	VIABLE	1364	16/02/2017	09/10/201
2432679	2432679	REPARACION DE CANAL DE RIEGO, EN ELLA/I/SISTEMA DE AGUA PA/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	APROBADO	25/10/2018	26/10/201	
2406221	2406221	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN ELLA/I/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	APROBADO	30/01/2018	31/12/201	
2447010	2447010	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN ELLA/I/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	APROBADO	08/06/2019	08/06/201	
2406482	2406482	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN ELLA/I/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	APROBADO	02/02/2018	31/12/201	
2046083	40618	INTRODUCCION DEL OVINO RAZA DOHNE MERINO MEDIANTE EL L/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	INSTITUTO NACIONAL DE I	CERRADO	VIABLE	145	03/10/2006	07/02/200
2382059	321888	RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAO SITE/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	ACTIVO	VIABLE	380	09/12/2015	02/12/201
2431270	2431270	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA Y RECEPTOR/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y	CERRADO	APROBADO	03/10/2018	11/10/201	
2431328	2431328	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA, EQUIPO MEC/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	APROBADO	03/10/2018	11/10/201	
2431373	2431373	ADQUISICION DE EQUIPO MEDIDOR DE DISTANCIA (DME) Y RECEPT/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	APROBADO	03/10/2018	11/10/201	
2431233	2431233	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA, EQUIPO MEC/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	APROBADO	03/10/2018	11/10/201	
2431283	2431283	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA, EQUIPO MEC/GN	GN	AGRICULTURA Y RIEGO	MINISTERIO DE AGRICULTI	CERRADO	APROBADO	03/10/2018	11/10/201	




MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS


 www.gob.pe/mef

 Jr. Junín 319, Lima 1 - Perú

 (511) 311 5930

Síguenos en:

 @MEF_Peru

 Ministerio de Economía y Finanzas - Oficial
